

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Selasa, 26/11/2024
PUKUL : 09.00 - selesai
JENIS MEETING : Koordinasi Ruang HD dengan Nipro
TEMPAT : Ruang Meeting Lt. 3

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Listrik
	Masalah : 1. <i>Conncting</i> listrik belum dilakukan 2. Panel listrik RO sudah ditarik kabel dan belum ada panel yang terpasang 3. Panel antar mesin dan AC harus tersendiri
	Keterangan :
	PIC : IPSRS Pak Lambang
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan IPSRS dan pak lambang untuk <i>connecting</i> listrik di bed HD 2. Pemasangan panel di ruang RO progres oleh IPSRS 3. Pemasangan dan penempatan panel mesin HD dan AC koordinasi dengan Pak Lambang
2	Pokok Bahasan : Pipa
	Masalah : Jaringan pipa sudah dilakukan, a. Pengetasan b. Belum di berikan cover c. Belum terpasang <i>connector</i>
	Keterangan :
	PIC :
	Rencana Tindak Lanjut : pada jaringan pipa diruang HD a. Hasil dari pengetesan pipa pada hari pertama 8 bar dan pada hari kedua menjadi 7 bar (tidak ada indikasi kebocoran pada pipa) b. Koordinasi dengan Pak Hasto pemberian cover pada pipa kapan dapat dilakukan c. Koordinasi dengan pengadaan PT apakah <i>connector</i> sudah masuk di dalam penawaran atau belum, jika belum maka dimasukkan ke dalam penawaran terlebih dahulu
3	Pokok Bahasan : <i>Re-Use</i>
	Masalah : penggunaan air <i>re-use</i>
	Keterangan :
	PIC :
	Rencana Tindak Lanjut : Penggunaan <i>re-use</i> hanya menggunakan air dingin. a. Air PDAM : untuk pembersihan alat b. Air RO : untuk merendam Note : rumah sakit nanti menggunakan sistem <i>single use</i>

No	Penjelasan
4	Pokok Bahasan : Air Baku
	Masalah : 1. Penempatan air RO 2. Nilai air baku di temukan coliform yang tinggi, air keruh
	Keterangan :
	PIC : Kesling
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Penempatan toren air RO ada di lt. 4 2. Pemberian klorin tablet dengan batas maks 0.5 mg/liter dan bikinkan SOP tatalaksana pemberian klorin tablet pada air RO Note : pemberian klorin akan dilakukan oleh tim B3
5	Pokok Bahasan : Spoelhok
	Masalah : Pembuatan area spoelhok belum dilakukan
	Keterangan :
	PIC : Tukang RS (Pak Mantri)
	Rencana Tindak Lanjut : Pembuatan spoelhok dilakukan oleh Pak Mantri (contoh gambar terlampir) aliran pembuangan di jadikan satu ke-area kamar mandi pasien
6	Pokok Bahasan : Pengangkutan mesin HD dan RO
	Masalah : Berat mesin RO kurang lebi 100kg apakah diperkenankan menggunakan lift 4
	Keterangan :
	PIC : Vendor
	Rencana Tindak Lanjut : Koordinasi dengan direktur apakah diperbolehkan menggunakan lift 4 untuk mobilisasi barang-barang HD.

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS)

Pasuruan, 26 November 2024
Notulis

(Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.)

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Selasa, 26 November 2024.
 PUKUL : 09.00 - Selesai
 JENIS AGENDA : Koordinasi HO dengan Rupro
 TEMPAT : R. Meeting Lt- 3.

NO	NAMA	INSTANSI	TTD
1	Restu-K		1 Restu-K
2	Dwi Suska H		2 Dwi Suska H
3	Saiful Anwar		3 Saiful Anwar
4	Handriol S	PT. SRU	4 Handriol S
5	M. Arif Dandariyo	PT. SRU	5 M. Arif Dandariyo
6	Heri Kusworo	pt- SRU	6 Heri Kusworo
7	SATFUPPIN		7 SATFUPPIN
8	PAGUH L		8 PAGUH L
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29


Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
 Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
 www.rs-primahusada.com

LAMPIRAN DOKUMENTASI


1. Tempat Spoelhok



2. Connector

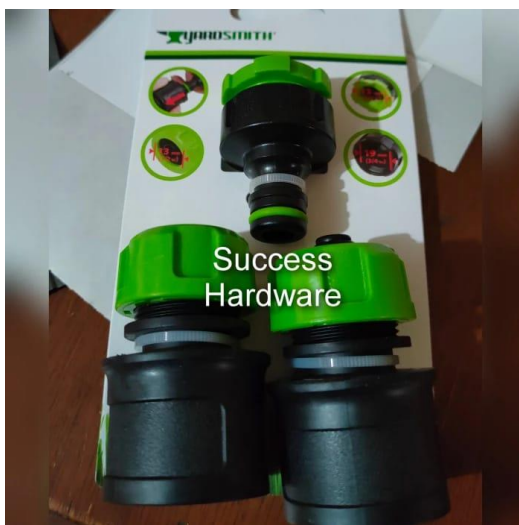

3. Cover Pipa (Calsibord)

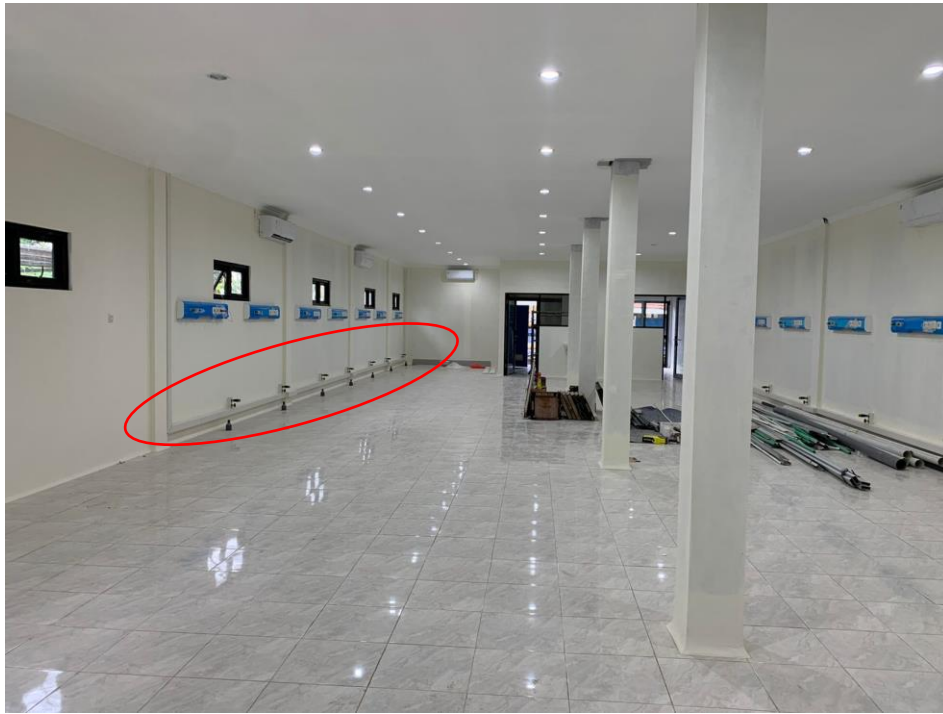

4. Dokumentasi di lapangan

